حوزه معاونت شهرسازی و معماری

چک لیست ایمن سازی جداره های گودبرداری و سازه نگهبان

اطلاعات مربوط به مالک:

نام و نام خانوادگی مالک:

شماره پروانه ساختمان: شماره ثبتی ملک:

آدرس ملک:

اطلاعات مربوط به مهندس ناظر:

ناغم و نام خانوادگی مهندس ناظر:

شماره عضویت سازمان نظام شماره پروانه اشتغال شماره شهرسازی

مهندسی ساختمان استان تهران: به کار مهندسی: شهرداری تهران:

اطلاعات مربوط به گودبرداری:

تعداد طبقات ساختمان: ___ **طبقه**

تعداد طبقات زیرمین: ___ **طبقه**

وضعیت اطراف گودبرداری:

س:ساختمان

ز:زمین بایر

خ:خیابان

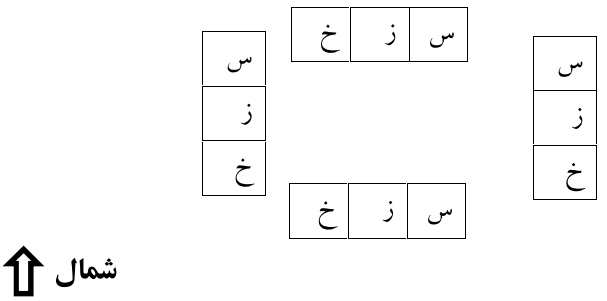

شمال ⇧

در صورتی که در کنار زمین ساختمانی قرار دارد تعداد طبقات آن در مربع کناری درج شود.ضمناً هر گونه اطلاعات موجود درباره قدمت ساختمان (های) کناری و نحوه بارگذاری آن ذیلاً درج شود.

ابعاد گودبرداری:

عرض: ____ **متر** **عمق:** ____ **متر** **طول:** ____ **متر**

اطلاعات مربوط به خاک محل:

مشخصات فیزیکی خاک: C=____ kg/cm2 Φ=____ درجه

وضعیت آب زیرزمینی در محدوده احداث ساختمان : ☐خیلی پایین ☐پایین ☐بالا

سیستم سازه نگهبان موقت:

مقادیر مفروض برای سازه نگهبان: عمق گودبرداری: ____ **متر**

سربار موثر کنار گود: ____ تن بر متر مربع

فواصل خرپاها: ____ **متر**

نوع سازه نگهبان انتخابی: ☐عدم نیاز ☐ نوع یک ☐ نوع دو ☐نوع سه ☐ نوع چهار

نوع شمع: ☐ با پاشنه ☐بدون پاشنه

طول شمع: ____ **متر**

قطر شمع: ____ **سانتیمتر**

ابعاد پی: **طول:** ____ **سانتیمتر** **عرض:** ____ **سانتیمتر** **ارتفاع:** ____ **سانتیمتر**

جزئیات میلگرد گذاری: **میلگرد** ____ **به فاصله** ____ **سانتیمتر**

الف:میلگرد طولی شمع: **تعداد:** ____ **نمره:** ____

ب:عناصر بادبندی:

ج:قطعات مهاری عضو قائم:

د:حداقل طول گیرداری عضو قائم:

نقشه های سازه نگهبان موقت مذکور به مالک و پیمانکار ساختمان تحویل داده شده و نحوه اجرای آن و رعایت ضوابط ایمنی به ایشان تفهیم وابلاغ شد.

نام و نام خانوادگی مهندس ناظر

تاریخ امضا

با اعلام دریافت نقشه های سازه نگهبان موقت و تفهیم نحوه اجرای آن رعایت ضوابط ایمنی آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران را متعهد می شوم.

نام و نام خانوادگی مالک نام و نام خانوادگی پیمانکار

تاریخ امضا تاریخ امضا

توجه:چنانچه سازه نگهبان موقت در طرفین گود از انواع مختلف باشد به ازای هر نوع سازه نگهبان موقت یک برگ جداگانه از صفحه دوم این چک لیست باید تکمیل و ضمیمه شود.
